



SCRUM

CLASE 1

Sebastian Alvarado, Roberto Ibaceta Cisternas



EMPECEMOS >

CONTACTO

Gmail

- roberto.ibaceta@mail.udp.cl

Wsp

- [+569 42663436](https://wa.me/56942663436)

Ds

- [roberibaz](#)



¿Qué veremos hoy?

01 **Por que Scrum?**
El Problema de planificar todo de una vez


02 **Roles y Eventos**
Marco de Trabajo

03 **Product Backlog**
Historias de usuario y Priorizacion

04 **Sprint Backlog**
Que es un sprint y como seleccionarlo

05 **Jira**
Conocer la Herramienta

06 **Entrega Proyecto**
Primera Entrega

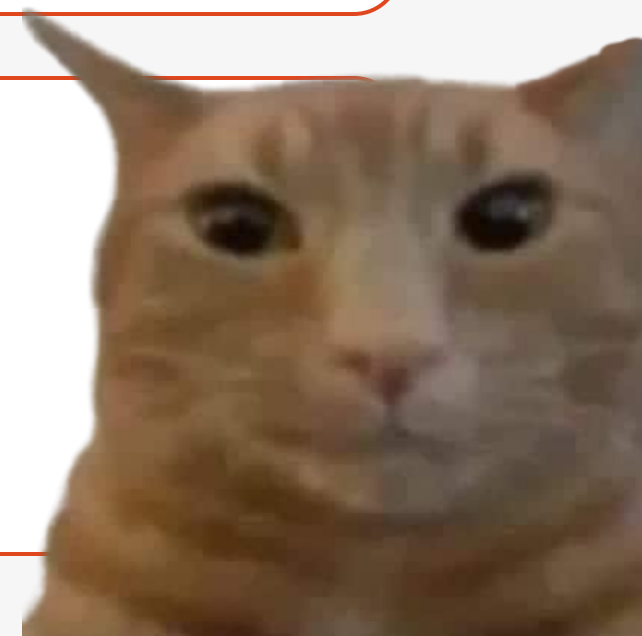

Por que Scrum?

Plan tradicional

- Se planifica TODO al inicio del proyecto
- Entrega al final del proyecto
- Poca visibilidad del avance real

Scrum

- Se planifica iterativamente (Sprints)
- Requisitos flexibles y priorizados
- Entregas parciales cada 2-3 semanas



Ejemplo - App para Casino

App para pedir comida por anticipado y evitar filas

Plan tradicional

- **6 semanas a ciegas:** Se construye el 100% de la app (login, menú, pago, notificaciones) sin validación intermedia.
- **Prueba tardía:** Recién en la **semana 7** se muestra el producto por primera vez a los usuarios.
- **Sin tiempo de reacción:** Si hay fallas con el cliente, el costo de corrección es alto.

Scrum

- **Semana 2:** Producto mínimo funcional (ver el menú del día) y feedback temprano del cliente.
- **Semana 4:** Se integra la funcionalidad de pedidos sobre algo que ya funciona.
- **Detección temprana:** Los errores se corrigen a tiempo durante el semestre.

¿Qué puede salir mal si se ignora Scrum?

Llegar al final del semestre para descubrir que la pasarela de pago no calza con lo que pidió el cliente (profesor), perdiendo la oportunidad de corregirlo a tiempo.

ROLES EN SCRUM

Caso de estudio: Aplicación para el Casino



Define la visión y prioriza el backlog

- **Priorización clave:** Decide que lo primero es mostrar el menú del día antes que el pago online, por ser la urgencia principal.



Facilita el proceso y elimina obstáculos

- **Gestión de bloqueos:** Nota que 2 integrantes están bloqueados en la implementación del menú por lo que busca alternativas.



Facilita el proceso y elimina obstáculos

- **Decisión técnica:** Define cómo construirlo (lenguaje, base de datos del menú) y ejecuta el código funcional.



EVENTOS CLAVE

Caso de estudio: Aplicación para el Casino

Sprint Planning

Planificación del trabajo a realizar.

- **Ejemplo Casino:** Deciden hacer para las próximas 2 semanas "ver el menú del día".

Daily Scrum

Reunión diaria de sincronización, 10 a 15 min.

- **Ejemplo Casino:** En Discord: uno avanza la BD del menú y otro avisa que está atascado conectándola.

Sprint Review

Presentación de resultados al final del sprint.

- **Ejemplo Casino:** Al cerrar las 2 semanas, muestran la versión funcional para ver el menú y pedir.

Sprint Retrospective

Reflexión y mejora del proceso.

- **Ejemplo Casino:** Notan que 2 integrantes duplicaron trabajo sin saberlo y acuerdan repartirse mejor las tareas en el próximo sprint.



ARTEFACTOS DE SCRUM

Product Backlog



Lista priorizada de requisitos.

Ejemplo Casino

- **Lista completa:** ver menú del día, hacer pedido, pagar online, notificaciones, calificar pedido e historial.

Sprint Backlog



Tareas seleccionadas para el sprint.

Ejemplo Casino

- Para el Sprint 1 solo entran: "**ver el menú del día**" y "**hacer un pedido**". El resto se posterga.

Incremento



Resultado funcional entregado al final del sprint.

Ejemplo Casino

- En la semana 2 se entrega una app básica pero funcional donde ya se puede ver el menú y pedir.

¿Qué puede salir mal si se ignora Incremento funcional?

Sin un Incremento real y funcional al final de cada sprint, el equipo puede reportar "vamos avanzando" durante todo el semestre sin que nadie note que en realidad nada funciona hasta que sea demasiado tarde para corregirlo.




PRODUCT BACKLOG Y SPRINT BACKLOG

Lo importante para la entrega 1

Product Backlog

TODO lo que se podría hacer, en orden de prioridad, para todo el proyecto.

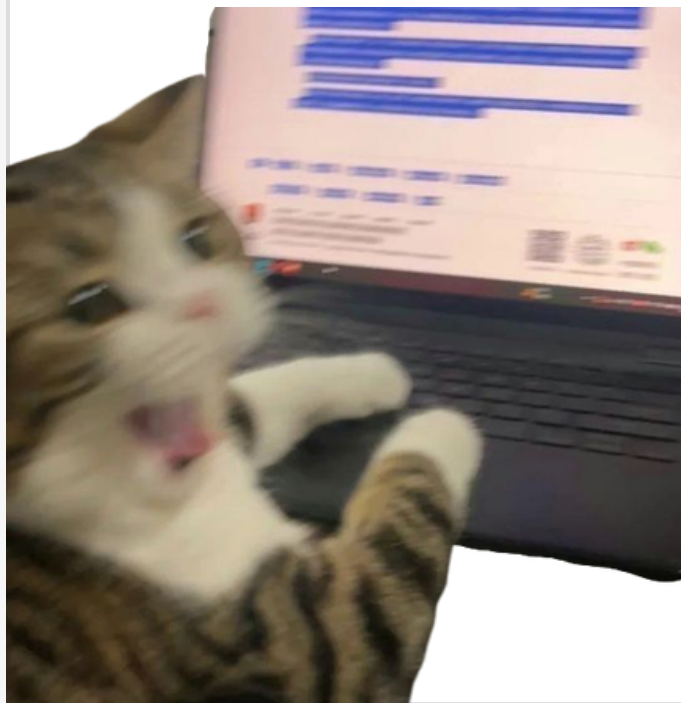

El mapa completo.

Sprint Backlog


SOLO lo que nos comprometemos a hacer en este sprint específico.



La ruta de las próximas semanas.



PROCESO DE SCRUM

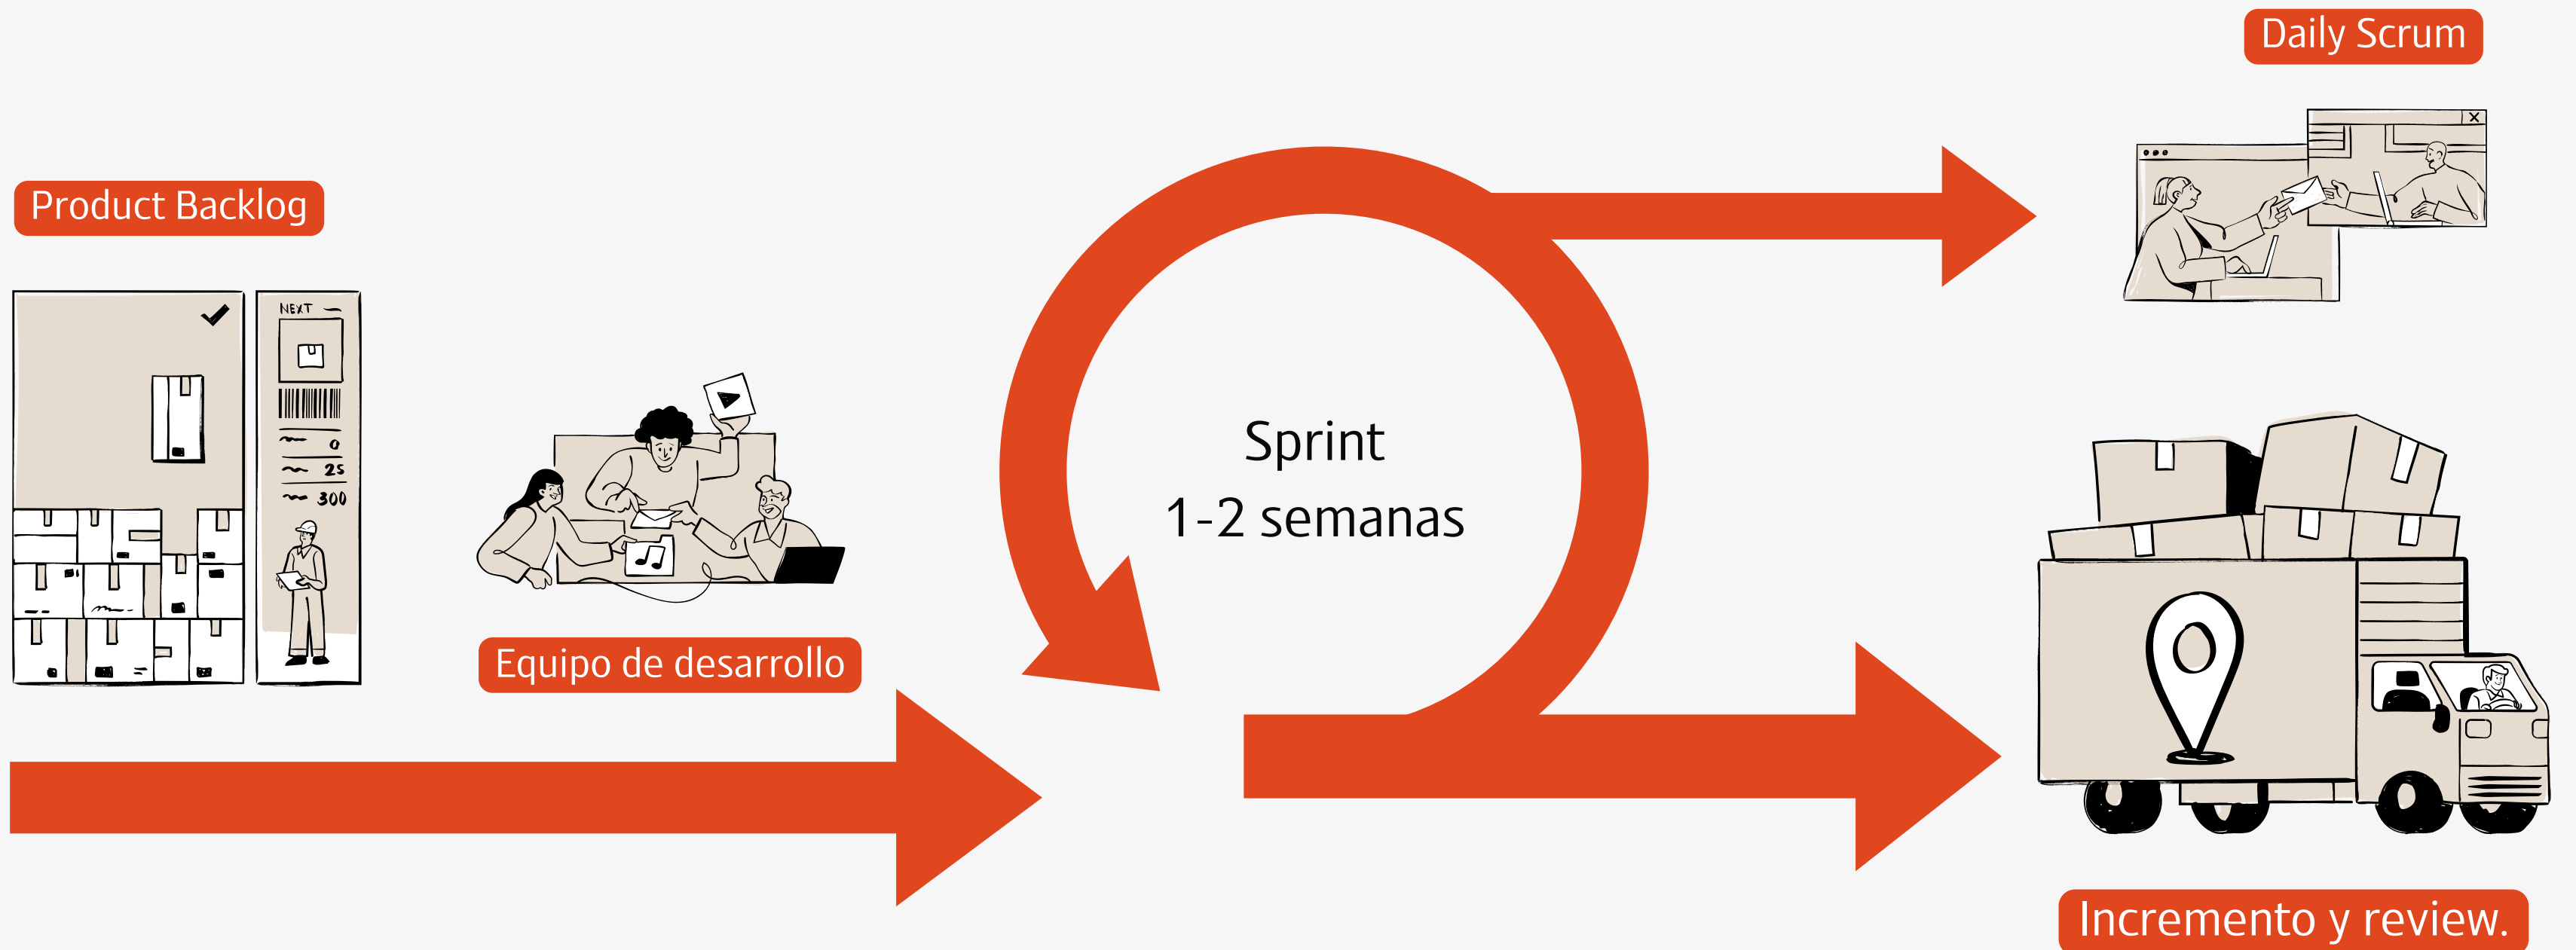

JIRA



Resumen en una frase

Product Backlog todo lo que el proyecto podría necesitar, priorizado.

Sprint Backlog el compromiso concreto para las próximas semanas.

Jira donde documentamos y hacemos seguimiento de ambos.

¿Dudas? Discord / Wsp/ Gmail



abraso
